

| OPTIMIZE |

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAN. TİC. A.Ş.

XXXXXXX ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

XXXX ADA X PARSEL

HAFTALIK İLERLEME RAPORU

XX.XX.XXXX

| OPTIMIZE |

Optimize Proje Yönetim Danışmanlık

Mühendislik LTD. ŞTİ.


OPTIMIZE

1. Genel Durum

1.1. 2. Etap Temel İmalatı

2. Etap temel planı Resim-1’de gösterilmiştir. Her bir temelin durumu renk kodları ile işaretlenmiştir. Renk kodları (Lejant) ise Resim-2’de gösterilmiştir.

Resim-1 Temel Planı

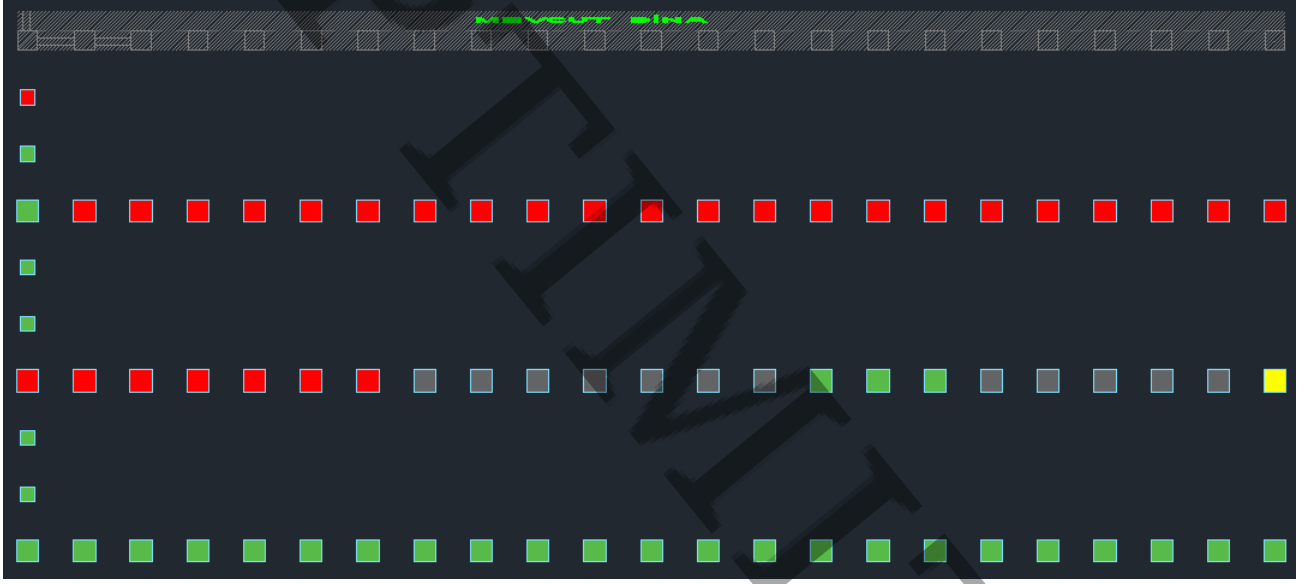

Resim-2 Lejant

	Toplam Temel Sayısı	75
	Kazı Sayısı	43
	Grobeton Sayısı	43
	Temel Döküm Sayısı	42
	Soket Döküm Sayısı	30

OPTIMIZE


1.2. 2. Etap Prefabrik Elemanların Üretimi

YYYYYYYYYYY xxxx ve xxxx betonarme yapı elemanları üretim fabrikasında XXXXXXXXXXXX ilave yapı için üretilecek olan elemanların listesi Tablo-1’de verilmiştir. Üretimin tamamlanma oranı Resim-3’de gösterilmiştir. Aşıkların üretimi başlamamıştır.


Tablo-1 Üretilecek Eleman Listesi

ELEMAN	MAKAS	KOLON (60x60)	KOLON (45x45)	DERE KİRİŞİ	AŞIK
PROJE MİKTARI	69	69	6	66	792
ÜRETİLEN	69	69	6	66	0
KALAN	0	0	0	0	792

Resim-3 Üretim Tamamlanma Oranları

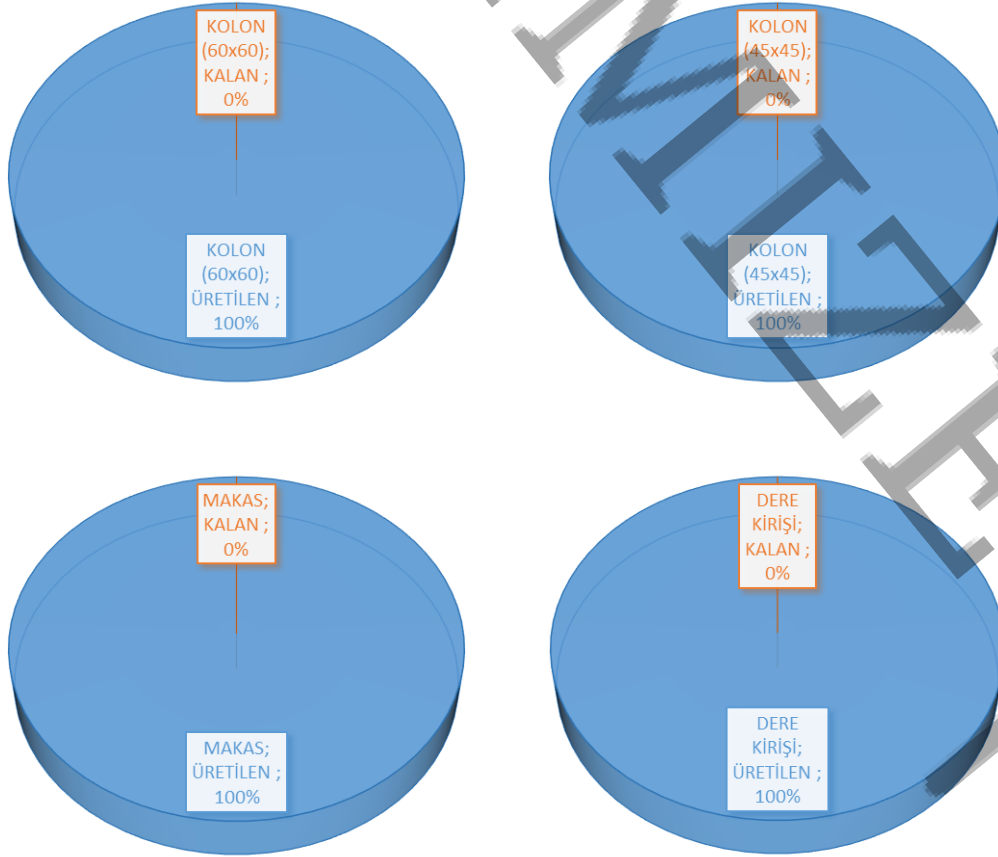

| OPTIMIZE |

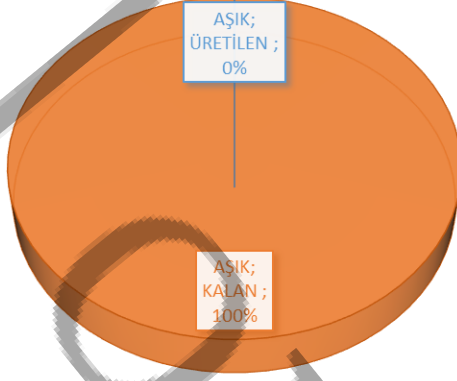

2. Devam Eden İmalatlar

2. Etap kalıp çalışmaları, inşaat demiri kesme ve bükme işlemleri ve demir montajı devam etmektedir. Gün içinde 7 adet soket betonu 2 adet temel beton dökümü yapılmıştır.

İdari bina soket ve kolonların beton dökümü tamamlanmıştır. Kalıp çalışmaları, demir kesme bükme ve montaj çalışmaları devam etmektedir. Perde beton dökümleri devam etmektedir.

2. etap yönünde kazı çalışmaları devam etmektedir.

Devam eden imalatlara ait fotoğraflar Resim-4-Resim-10 'de gösterilmiştir.

OPTIMIZE

Resim-4 Tesviye Kazısı



OPTIMIZE

Resim-5 2. Etap Temel Beton Dökümü



Resim-6 2. Etap



OPTIMIZE

Resim-7 İdari Bina Demir ve Kalıp Çalışmaları



Resim-8 İdari Bina Perde Beton Dökümü



OPTIMIZE

Resim-9 İdari Bina Genel Görünüm



OPTIMIZE

Resim-10 1. Etap Genel Görünüm

